



Prefeitura Municipal de Canitar

CEP: 18.990-000 - Canitar - SP-Fone: 14 3343-9100

Rua Joaquim Bernardo de Mendonça, S/N. °.

CNPJ 57.264.517/0001-05

www.canitar.sp.gov.br - obras@canitar.sp.gov.br



LAUDO TÉCNICO

Prezado(s) Sr(s).

ANEXO: Planilha de medição e relatório fotográfico

Eu, **EDUARDO FELIPE LUIZ FLORENCIO**, Arquiteto Urbanista e, Engenheiro de Segurança do Trabalho, registrado no CAU/SP sob n.º A112058-1, responsável técnico designado pela autora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR, ESTADO DE SÃO PAULO, com referência a obra como Objeto AMPLIAÇÃO DE UMA CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL - CAMARA MUNICIPAL DE CANITAR, NA RUA VEREADOR PEDRO MACEDO.

ATESTO, para devidos fins, meu parecer favorável ao pagamento no valor de **R\$ 51.669,31** (cinquenta e um mil e seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos), que perfaz um percentual acumulado de **35,49%** da segunda etapa.

Canitar/SP, 15 de abril de 2026

EDUARDO FELIPE LUIZ FLORENCIO
ARQUITETO URBANISTA
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CAU/SP: A112058-1

Planilha de Levantamento de Serviços - PLS

0.03 Contrato

Grau de sigilo
#EXTERNO.CONFIDENCIAL

Planilha de Levantamento de Serviços - PLS

LAUDO - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS

Proponente MUNICIPIO DE CANITAR	E-mail camara@camaracanitar.com.br	CPF/CNPJ Prop. 57.264.517/0001-05	Telefone Prop. 14 3343-1121
RT pelo Proj. Arquit./Edif. - RTP EDUARDO FELIPE LUIZ FLORENCIO	E-mail - RTP eduardoarqui@live.com	Nº CAU/CREA/CFT-RTP A112058-1	UF SP
RT pela Execução da Obra - RTE MARCELO MACHADO	E-mail - RTE engenharia@orpron.com.br	Nº CAU/CREA/CFT-RTE 5070960709	UF SP
Identificação do imóvel	Complemento Parte do Lote II N. A-1		
Endereço Rua Vereador Pedro Macedo			
Bairro Centro	CEP 18990-000	Município Canitar	UF SP
Matrícula	ORI (Regst. de Imóveis)	Coordenadas (Graus°, Min', S")	Construtora (se houver)
Cartório Reg. Imóveis	2.385	23°00'28.1" S 49°46'47.9"	W OPRON ENGENHARIA LTDA
			CNPJ 52.491.634/0001-98

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - PLS

HABITAÇÃO

DATAS & QUALIDADE

Serviços	Incidência	Execução do Item	Execução na Obra	Início	13/01/2026	Término Previsto	13/05/2026
	%	%	%				
Serviços Preliminares	8,99	100%	8,99	Data do Levantamento	15/04/2026		
Fundação da Ampliação do Prédio	41,26	71%	29,26	Nº Etapas previstas para conclusão da obra	4,00		
Superestrutura	44,85	20%	9,05	A Obra esta sendo executada observando as condições mínimas?	Sim		
Estacionamento	4,91	0%	0,00	A placa/adesevo CAIXA está afixada na obra?	Sim		
	0,00	0%	0,00	O alvará está válido?	Sim		
	0,00	0%	0,00	Data Emissão	26/05/2025	Data Vigência	
	0,00	0%	0,00	Projeto e especificações estão sendo cumpridos?	Sim		
	0,00	0%	0,00	Os serviços estão sendo executados de modo a prevenir o aparecimento de danos físicos/vícios	Sim		
	0,00	0%	0,00	Etapa prevista no cronograma físico-financeiro:	33.36%		
	0,00	0%	0,00	Situação da obra:	47.30%		
	0,00	0%	0,00	Observações			
	0,00	0%	0,00	Foram executadas contemplando a 2ª etapa (60% material e 40% de mão de obra) do Cronograma Físico Financeiro			
	0,00	0%	0,00				
Mensurado Acumulado Atual	100,01		47,30				
Mensurado acumulado no mês anterior			11,81				
Mensuração da etapa			35,49				

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



VISTA GERAL — FÔRMAS DE BALDRAME



VISTA GERAL — FÔRMAS DE BALDRAME



FÔRMA E ARMADURA — PILAR DE FUNDAÇÃO




FÔRMA E ARMADURA — PILAR DE FUNDAÇÃO




FÔRMA E ARMADURA — PILAR DE FUNDAÇÃO




ARMADURAS PILAR TÉRREO ESTOCADAS

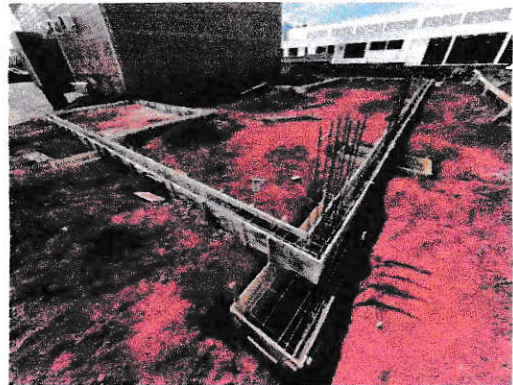

FÔRMA E ARMADURA — PILAR DE FUNDAÇÃO

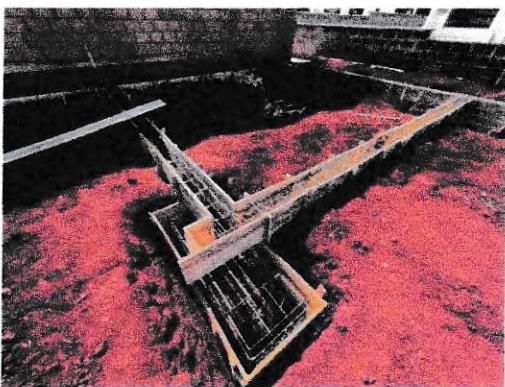

FÔRMA E ARMADURA — PILAR DE FUNDAÇÃO

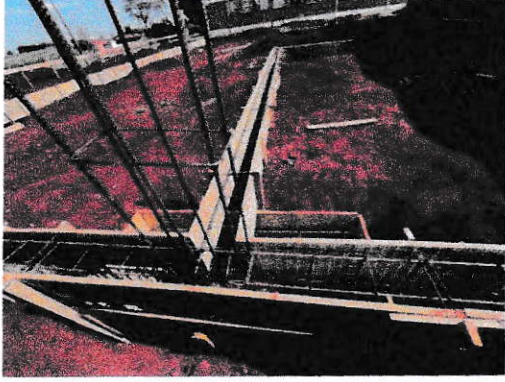

FÔRMA E ARMADURA — PILAR DE FUNDAÇÃO



ARMADURAS PILAR TÉRREO ESTOCADAS

Câmara Municipal de Canitar

RUA: RUA VEREADOR PEDRO MACEDO Nº 686, CENTRO
FONE: (14) 3332-4128
CNPJ: 57.264.954/0001-29

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

Nº 000002

DATA 16/04/2026

ATENÇÃO

Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições.

- 1º. - Em suas notas de entrega obrigatoriamente deverá estar anexado uma via da presente autorização de compra.
- 2º. - Não serão pagas as faturas cujas notas fiscais referem - se a materiais quem foram adquiridos verbalmente ou através de outro documento sem ser autorização de compra.
- 3º. - São as pessoas autorizadas para assinar esta Autorização de Compra: Prefeito e Enc. Setor de Compras.

FORNECEDOR: 001668

ORPRON ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO: R: LAZARO AGUIAR DOS SANTOS,115

CNPJ: 52.491.634/0001-98

INSCRIÇÃO:

CIDADE: PEDERNEIRAS

ESTADO: SP

FONE:

Modal.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº Processo: 5/2025 - Nº Licitação: 2 - Contrato: 4/2025

SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IPi	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
			De transporte.....			33.505,66
			NAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA=50 DE 12,5MM MONTAGEM AF 06/2022	0,00	9,2000	175,72
009	38,8	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCION AL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 1 0,0MM MONTAGEM AF 06/2022	0,00	11,0400	428,35
010	9,2	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCION AL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO, AÇO CA-60 DE 5,0MM MONTAGEM AF 06/2022	0,00	14,6400	134,69
011	45,65	MT	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO A F 08/2023	0,00	84,8800	3.874,77
012	93,82	MT	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RA DIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO AF 09/2021	0,00	4,0400	379,03
013	64	MT	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SI MILARES, EM MADEIRA SERRADA E=25MM AF 09/2020	0,00	122,4600	7.837,44
014	238	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCION AL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 1 2,5MM MONTAGEM AF 06/2022	0,00	9,2000	2.189,60
015	197	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCION A transportar.....			48.525,26

LOCAL DE ENTREGA:

OBSERVAÇÃO:

SUBTOTAL	51.669,31
DESCONTO	0,00
ACRÉSCIMO	0,00
TOTAL GERAL	51.669,31

CONDIÇÕES:

UNIDADE: 902 0,00

CLASS. ECONÔMICA:

CPD: 9.000000.902

FONTE DE RECURSO: 01 Tesouro

CÓD. APLICAÇÃO: 110 00 GERAL

Câmara Municipal de Canitar

PRESIDENTE

DIRETOR ADMINISTRATIVO
