



Prefeitura Municipal de Canitar

CEP: 18.990-000 - Canitar - SP-Fone: 14 3343-9100

Rua Joaquim Bernardo de Mendonça, S/N.º.

CNPJ 57.264.517/0001-05

www.canitar.sp.gov.br - obras@canitar.sp.gov.br



LAUDO TÉCNICO

Prezado(s) Sr(s).

ANEXO: Planilha de medição e relatório fotográfico

Eu, **EDUARDO FELIPE LUIZ FLORENCIO**, Arquiteto Urbanista e, Engenheiro de Segurança do Trabalho, registrado no CAU/SP sob n.º A112058-1, responsável técnico designado pela autora: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANITAR, ESTADO DE SÃO PAULO, com referência a obra como Objeto AMPLIAÇÃO DE UMA CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO COMERCIAL - CAMARA MUNICIPAL DE CANITAR, NA RUA VEREADOR PEDRO MACEDO.

ATESTO, para devidos fins, meu parecer favorável ao pagamento no valor de **R\$ 14.580,23** (quatorze mil, quinhentos e oitenta reais e vinte e três centavos), que perfaz um percentual de **10,02%** referente à execução parcial da terceira etapa

Canitar/SP, 30 de abril de 2026

EDUARDO FELIPE LUIZ FLORENCIO
ARQUITETO URBANISTA
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CAU/SP: A112058-1

Planilha de Levantamento de Serviços - PLS

0.03 Contrato

Grau de sigilo
#EXTERNO.CONFIDENCIAL

Planilha de Levantamento de Serviços - PLS

LAUDO - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS

Proponente MUNICIPIO DE CANITAR		E-mail camara@camaracanitar.com.br	CPF/CNPJ Prop. 57.264.517/0001-05	Telefone Prop. 14 3343-1121
RT pelo Proj. Arquit./Edif. - RTP EDUARDO FELIPE LUIZ FLORENCIO	E-mail - RTP eduardoarqui@live.com	Nº CAU/CREA/CFT-RTP A112058-1	UF SP	CPF - RTP 414.059.108-01
RT pela Execução da Obra - RTE MARCELO MACHADO	E-mail - RTE engenharia@orpron.com.br	Nº CAU/CREA/CFT-RTE 5070960709	UF SP	CPF - RTE 436.259.968-12
Identificação do imóvel Endereço Rua Vereador Pedro Macedo		Complemento Parte do Lote II N. A-1		
Bairro Centro	CEP 18990-000	Município Canitar	UF SP	
Matrícula Cartório Reg. Imóveis 2.385	ORI (Regst. de Imóveis) 23°00'28.1" S 49°46'47.9"	Coordenadas (Graus°, Min', S") W OPRON ENGENHARIA LTDA	Construtora (se houver) CNPJ	52.491.634/0001-98

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - PLS

HABITAÇÃO


DATAS & QUALIDADE

Serviços	Incidência	Execução	Execução	Início	13/01/2026	Término Previsto	13/05/2026
	%	%	%	Data do Levantamento	30/04/2026		
				Nº Etapas previstas para conclusão da obra		4,00	
Serviços Preliminares	8,98	100%	8,98	A Obra esta sendo executada observando as condições mínimas?		Sim	
Fundação da Ampliação do Prédio	41,26	95%	39,28	A placa/adesivo CAIXA está afixada na obra?		Sim	
Superestrutura	44,85	20%	9,06	O alvará está válido?		Sim	
Estacionamento	4,91	0%	0,00	Data Emissão	26/05/2025	Data Vigência	
	0,00	0%	0,00	Projeto e especificações estão sendo cumpridos?		Sim	
	0,00	0%	0,00	Os serviços estão sendo executados de modo a prevenir o aparecimento de danos físicos/vícios		Sim	
	0,00	0%	0,00	Etapa prevista no cronograma físico-financeiro:		45.38%	
	0,00	0%	0,00	Situação da obra:		57.32%	
	0,00	0%	0,00	Observações			
	0,00	0%	0,00	Foram executadas parcialmente as atividades contempladas na 3ª etapa (60% material e 40% mão de obra) do Cronograma Físico-Financeiro, correspondente a 10,02% da incidência total da obra, contemplando concretagem dos blocos de coroamento, vigas baldrame e impermeabilizações			
	0,00	0%	0,00				
Mensurado Acumulado Atual	100,00		57,32				
Mensurado acumulado no mês anterior			47,30				
Mensuração da etapa			10,02				

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



VISTA GERAL - BALDRAMES CONCRETADOS E IMPERMEABILIZADOS

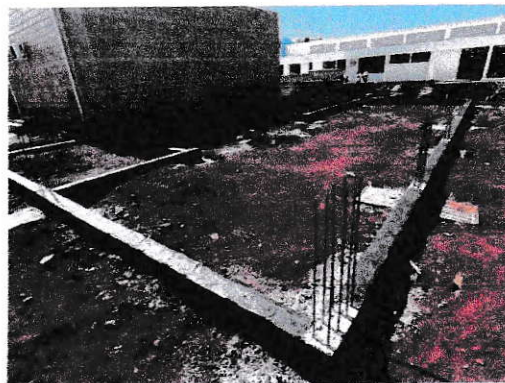

VISTA GERAL - BALDRAMES CONCRETADOS E IMPERMEABILIZADOS

Planilha de Levantamento de Serviços - PLS



VISTA GERAL - BALDRAMES CONCRETADOS E IMPERMEABILIZADOS



VISTA GERAL - BALDRAMES CONCRETADOS E IMPERMEABILIZADOS




VISTA GERAL - BALDRAMES CONCRETADOS E IMPERMEABILIZADOS




VISTA GERAL - BALDRAMES CONCRETADOS E IMPERMEABILIZADOS



VISTA GERAL - BALDRAMES CONCRETADOS E IMPERMEABILIZADOS

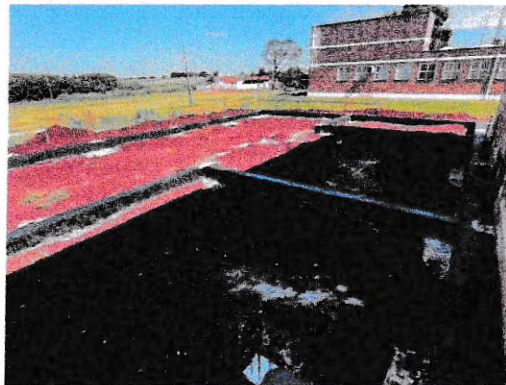

VISTA GERAL - BALDRAMES CONCRETADOS E IMPERMEABILIZADOS

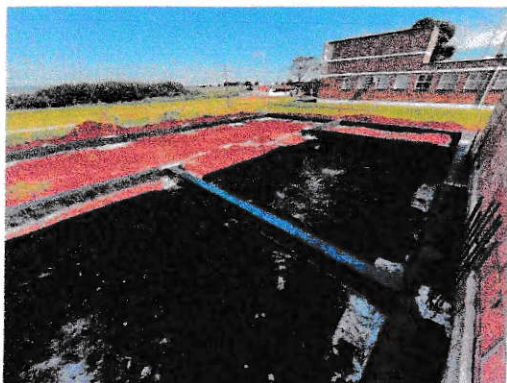

VISTA GERAL - BALDRAMES CONCRETADOS E IMPERMEABILIZADOS



VISTA GERAL - BALDRAMES CONCRETADOS E IMPERMEABILIZADOS

Planilha de Levantamento de Serviços - PLS

30 de abril de 2026, Canitar - SP

LD Local e data

RL Cliente/Proponente

Nome: **MUNICIPIO DE CANITAR**

CPF: **57.264.517/0001-05**

AE Responsável Técnico pela Manifestação de Engenharia

Nome: **EDUARDO FELIPE LUIZ FLORENCIO**

CPF: **414.509.108-01**

CAU/CREA/CFT: **A112058-1 / SP**

Câmara Municipal de Canitar

RUA: RUA VEREADOR PEDRO MACEDO Nº 686, CENTRO
FONE: (14) 3332-4128
CNPJ: 57.264.954/0001-29

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

Nº 000003

DATA 04/05/2026

FORNECEDOR: 001668

ORPRON ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO: R. LAZARO AGUIAR DOS SANTOS,115

CNPJ: 52.491.634/0001-98

INSCRIÇÃO:

CIDADE: PEDERNERAS

ESTADO: SP

FONE:

ATENÇÃO

Não nos responsabilizamos pela demora nos pagamentos das faturas que nos foram apresentadas sem a observação rigorosa das seguintes condições.

- 1º. - Em suas notas de entrega obrigatoriamente deverá estar anexado uma via da presente autorização de compra.
- 2º. - Não serão pagas as faturas cujas notas fiscais referem - se a materiais quem foram adquiridos verbalmente ou através de outro documento sem ser autorização de compra.
- 3º. - São as pessoas autorizadas para assinar esta Autorização de Compra: Prefeito e Enc. Setor de Compras.

Modal.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº Processo: 5/2025 - Nº Licitação: 2 - Contrato: 4/2025

SOLICITAMOS DE Vv. Ss. O FORNECIMENTO DO SEGUINTE:

Nº	QTDE	UND	MATERIAL / SERVIÇO	IP	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	6,8	MT	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDR AME, FCK 30MPA COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, A DE NSAMENTO E ACABAMENTO AF 01/2024	0,00	617,5300	4.199,20
002	7,2	MT	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDR AME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, A DENSAMENTO E ACABAMENTO AF 01/2024	0,00	617,5300	4.446,22
003	30,25	MT	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E=1,5CM AF09/2023	0,00	51,4700	1.556,97
004	102	MT	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁ LTICA 2 DEMÃOS. AF 09/2023	0,00	42,9200	4.377,84

LOCAL DE ENTREGA:

OBSERVAÇÃO:

SUBTOTAL	14.580,23
DESCONTO	0,00
ACRÉSCIMO	0,00
TOTAL GERAL	14.580,23

CONDIÇÕES:

UNIDADE: 902 0,00

CLASS. ECONÔMICA:

CPD: 9.000000.902

FONTE DE RECURSO: 01 Tesouro

CÓD. APLICAÇÃO: 110 00 GERAL

Câmara Municipal de Canitar

PRESIDENTE

DIRETOR ADMINISTRATIVO
